


## 견적 요청서

### 설계안 A

1. 컨테이너 20ft 일반 규격 사용. (도장 예정이므로 중고 컨테이너 사용 가능)
2. 전체 화이트 컬러 도장.
3. 전면 / W2500\*H1800 중앙정렬로 타공 후 픽스창 설치.
4. 후면 / W800\*H2100 좌측에 타공 후 시건 도어 설치.


유리픽스창 W2500\*H1800

<전면>

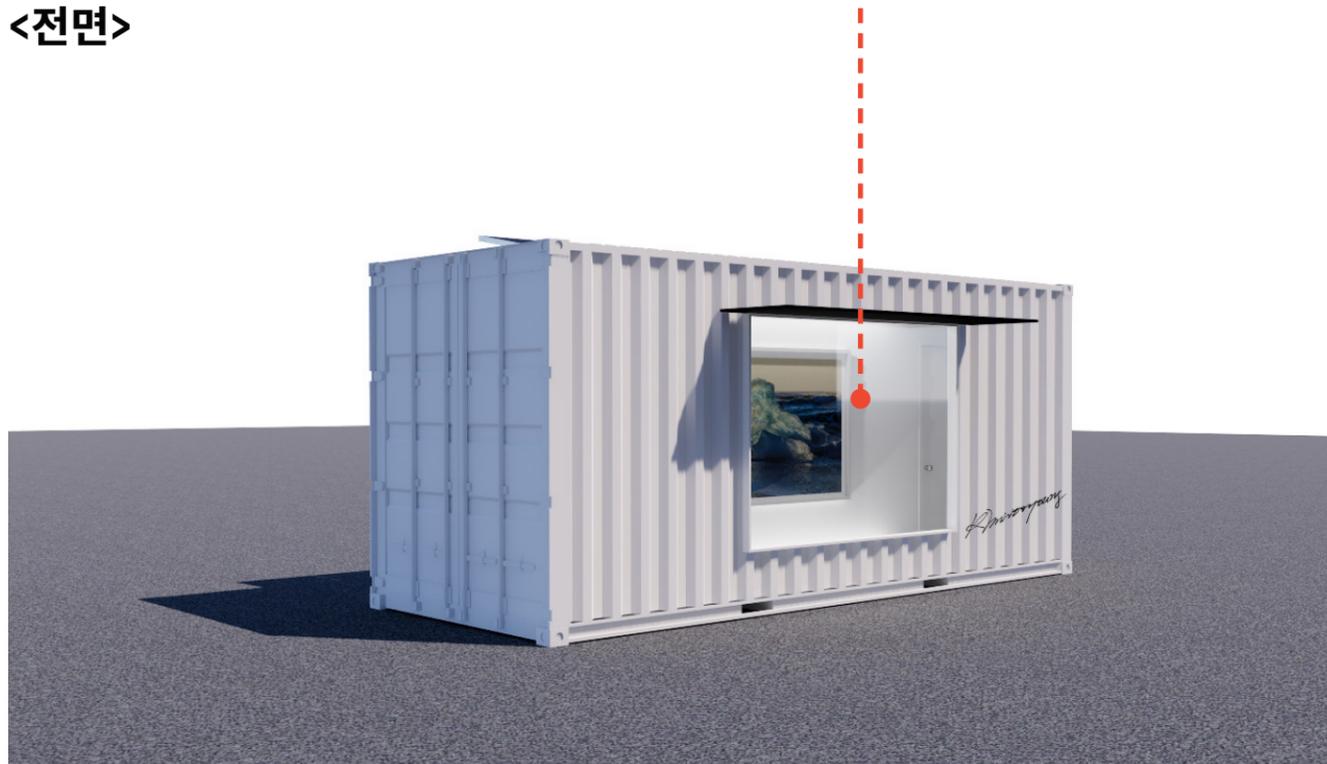

시건 도어 W800\*H2100

<후면>

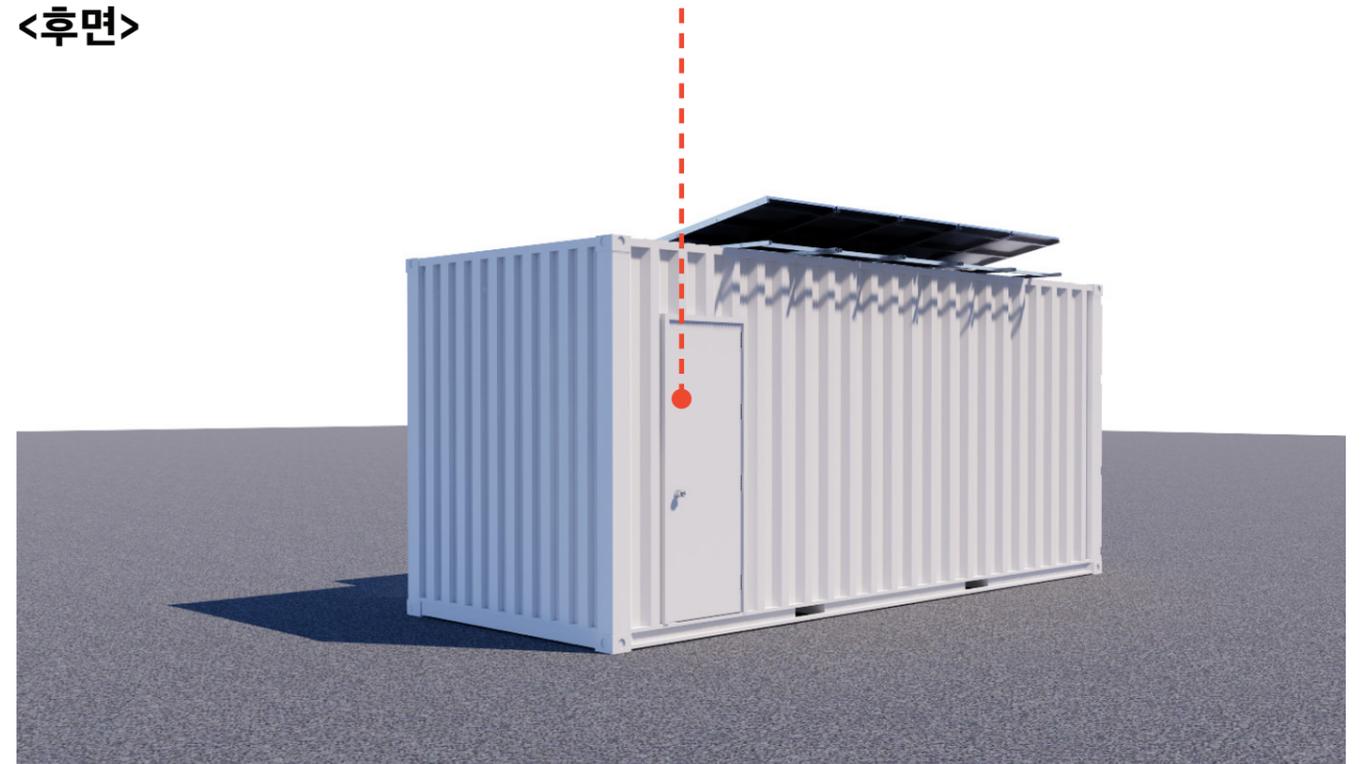


## 견적 요청서

### 설계안 A

- + 5. 내부벽(두께 100mm) 제작 가능 여부 확인 요청.
- + 6. 사이니지 제작 및 시공 가능 여부 확인 요청.
- + 7. 금속 처마 제작 및 설치 가능 여부 확인 요청.
- + 8. 자가 전기 태양광 시스템 (지붕 위 패널 설치) 작업 가능 여부 확인 요청.


### <내부>

내부벽 100mm 흰색 도장 마감.  
벽 우측에 도어 W800\*H2100 시공.

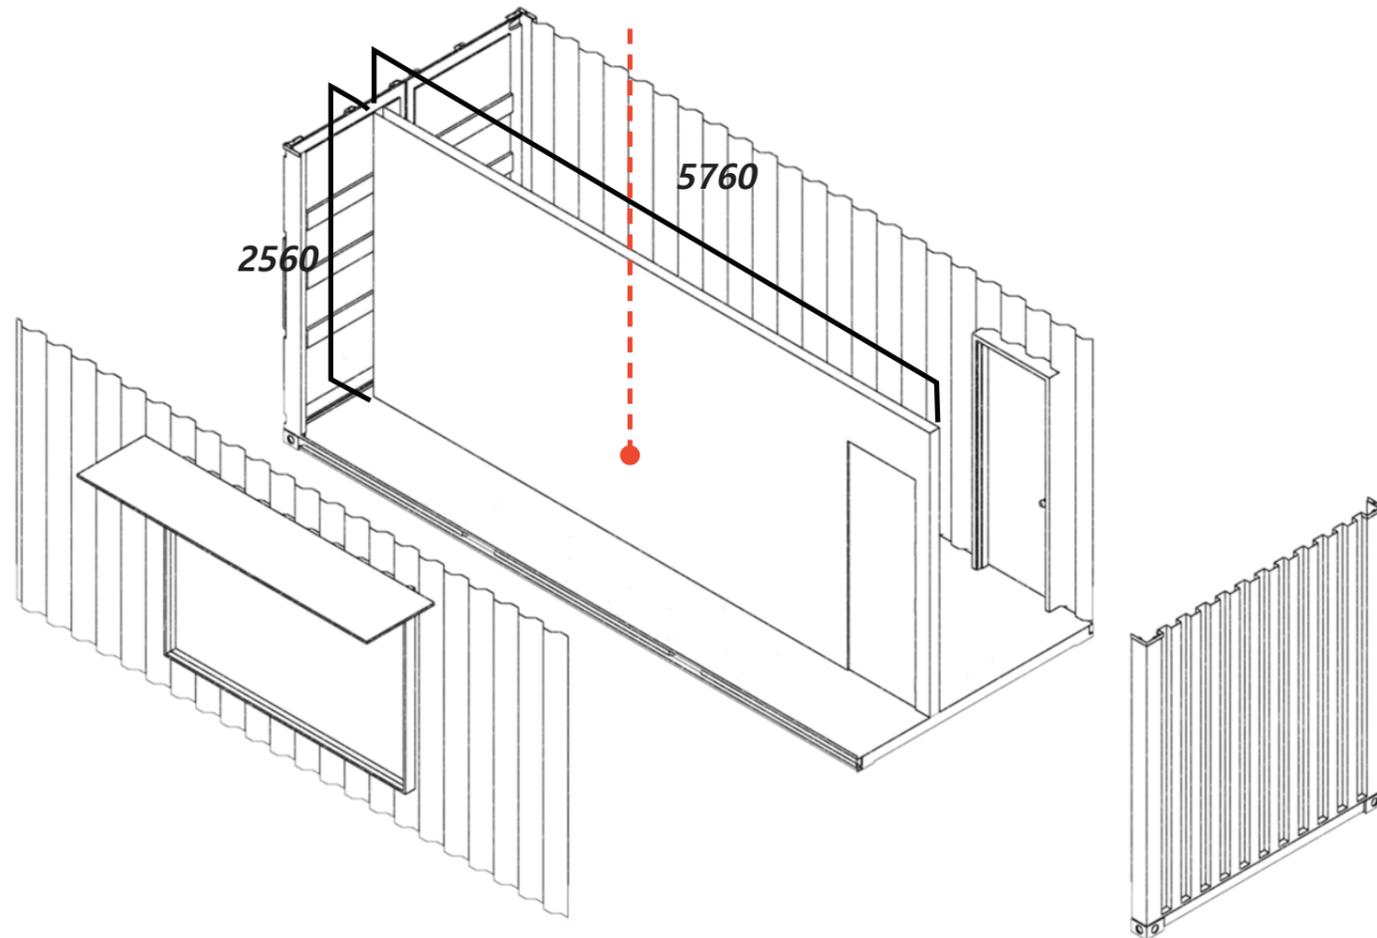

### <외부>

지붕에 태양광 패널 설치해  
실내 조명에 전력 공급.

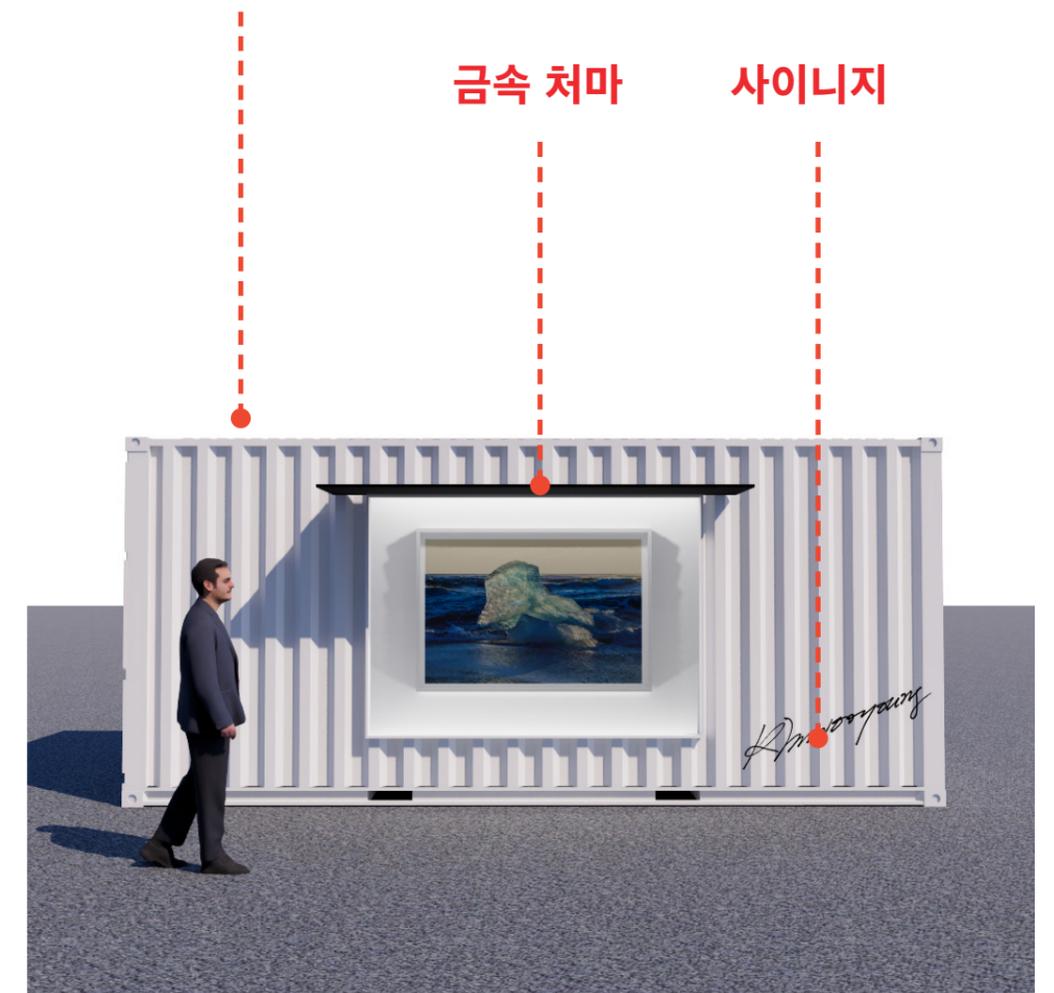


## 견적 요청서

### 설계안 B

1. 컨테이너 사이즈 W2.4 x H2.6 x D4 (m) 로 개조.
2. 전체 화이트 컬러 도장.
3. 전면 / W2500\*H1800 중앙정렬로 타공 후 픽스창 설치.
4. 후면 / W800\*H2100 좌측에 타공 후 시건 도어 설치.


유리픽스창 W2500\*H1800

<전면>

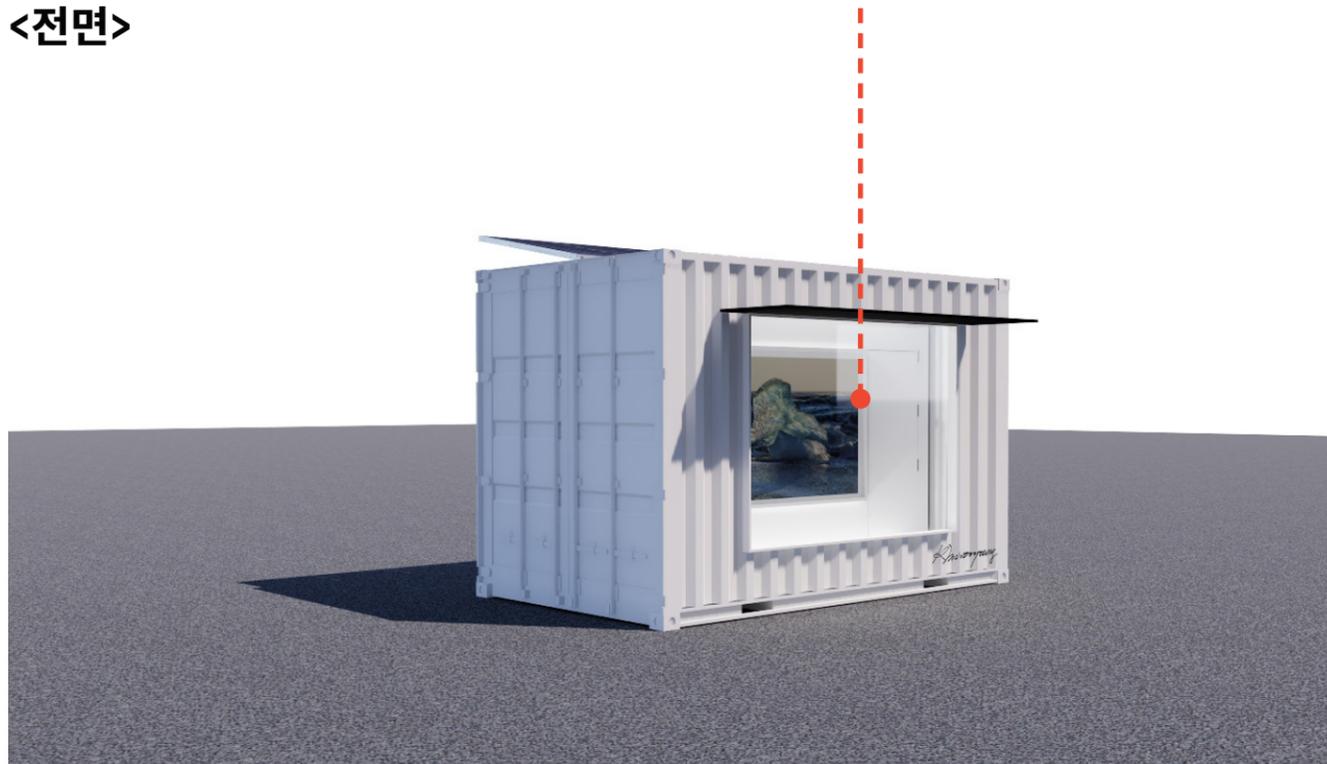

시건 도어 W800\*H2100

<후면>

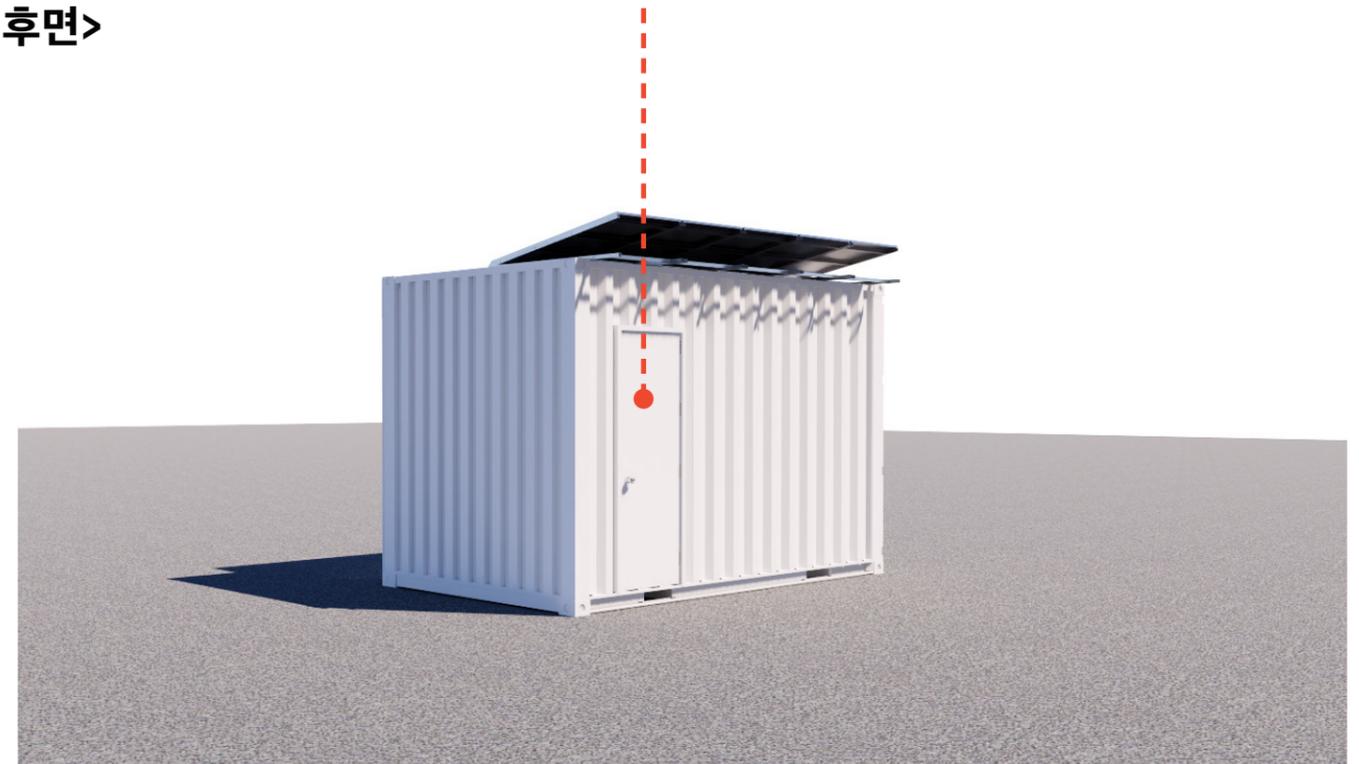


## 견적 요청서

### 설계안 B

- + 5. 내부벽(두께 100mm) 제작 가능 여부 확인 요청.
- + 6. 사이니지 제작 및 시공 가능 여부 확인 요청.
- + 7. 금속 처마 제작 및 설치 가능 여부 확인 요청.
- + 8. 자가 전기 태양광 시스템 (지붕 위 패널 설치) 작업 가능 여부 확인 요청.

### <내부>

내부벽 100mm 흰색 도장 마감.  
벽 우측에 도어 W800\*H2100 시공.

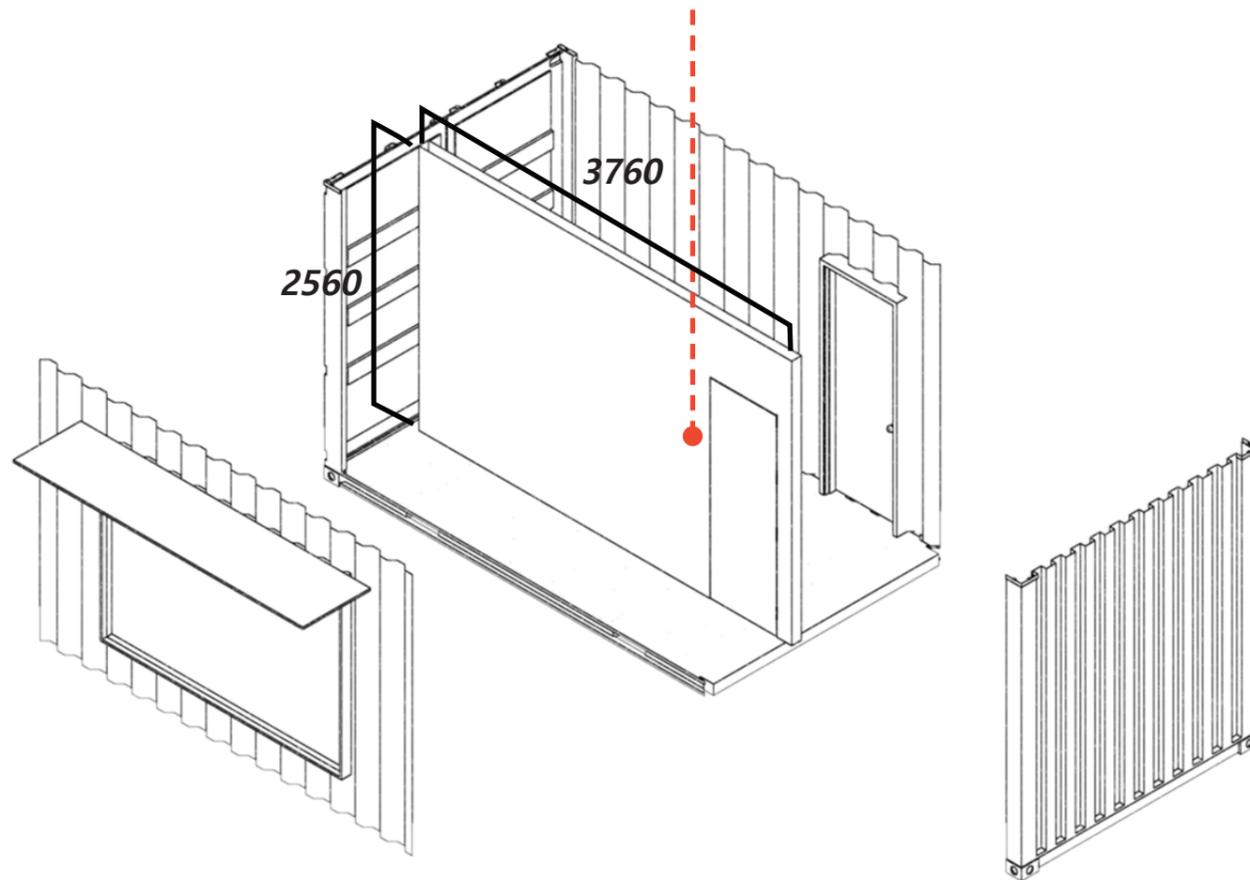

### <외부>

지붕에 태양광 패널 설치해  
실내 조명에 전력 공급.

